



Drucksachennummer: DS-25/0070
Drucksachenart: Drucksache
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Haftring 21

Datum: 27.05.2025
Federführung: Bau- und Ordnungsamt

Antragsteller

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Tourismus (Vorberatung)	11.06.2025	Ö
Finanzausschuss (Vorberatung)	16.06.2025	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	18.06.2025	N
Stadtvertretung (Entscheidung)	26.06.2025	Ö

Begründung

In ihrer Sitzung am 12.12.2019 beschloss die Stadtvertretung einstimmig, die Turnhalle am Haftring zu erhalten und entsprechende Sanierungsmaßnahmen vorzubereiten. Die Verwaltung wurde damals beauftragt, unverzüglich mit der erforderlichen Planung zu beginnen und die Turnhalle in das Städtebauförderprogramm Ueckermünde-Ost aufzunehmen (vgl. DS-19/0046). Im Folgenden erklärten die Stadtvertreter am 30.06.2022 nach Vorliegen der Entwurfsplanung mehrheitlich verbindlich, die für die Durchführung des Vorhabens „Sanierung und Erweiterung Turnhalle am Haftring“ erforderlichen Auszahlungen auf der Grundlage der Kostenberechnung vom 29.03.2022 sowohl für den 1. Bauabschnitt als auch den 2. Bauabschnitt bereitzustellen (vgl. DS-22/0247).

Schließlich wurde in der Sitzung am 29.06.2023 einstimmig eine Umsetzung des Gesamtbauvorhabens bestehend aus dem 1. Bauabschnitt (energetische Sanierung) und dem 2. Bauabschnitt (Erweiterung und Anbau) wie folgt beschlossen (vgl. DS-23/0332):

1. Die Stadtvertretung beschließt, mit den bereits bewilligten Fördermitteln den 1. Bauabschnitt zur Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Haftring 21 zu realisieren.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, im Vorfeld die dafür erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen auf Grundlage der erteilten Baugenehmigung für das Gesamtvorhaben zu klären.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, Fördermittel für den 2. Bauabschnitt einzuwerben, um langfristig dem Nutzungskonzept des Gesamtvorhabens Rechnung zu tragen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, ggf. baulich erforderliche Maßnahmen zu treffen, die die Nutzung der Turnhalle langfristig sicherstellen für den Fall, dass die Finanzierung für den 2. Bauabschnitt nicht gesichert ist.

Für den 1. Bauabschnitt konnten Mittel aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 eingeworben werden. Mit Zuwendungsbescheid des Landesförderinstitutes vom 15.12.2021 in der Fassung des 2. Änderungsbescheides vom 20.09.2023 wurden insgesamt für diesen Abschnitt 1.326.300,00 Euro bewilligt.

Für den 2. Bauabschnitt wurden Städtebaufördermittel aus der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme der Stadt Seebad Ueckermünde „Ost“ per Zustimmungsbescheid des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 28.05.2024 in Höhe 1.100.000 Euro bewilligt. Bei diesen Mitteln handelt es sich um sogenannte Umschichtungsmittel aus dem Programmjahr 2018.

Der aktuelle Finanzierungsplan ist als Anlage 1 beigefügt.

Zwischenzeitlich erhielt die Stadt mit Schreiben vom 12.05.2025 vom Ministerium die Aufforderung zur Schlussabrechnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost“. Als Stichtag für die Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme ist der **31.12.2025** festgelegt! Den Maßgaben der Städtebauförderrichtlinien entsprechend ist die Schlussabrechnung bis zum 31.12.2026 dem Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern zur Prüfung zuzuleiten. Die BIG Städtebau GmbH als treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt für die Maßnahme „Ost“ konnte im Gespräch eine mögliche Ausnahme beim Ministerium erwirken, wenn wir einen einmaligen Antrag auf Stichtagsverlängerung auf den **30.06.2026** stellen. Auch in diesem Fall ist die Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme zum 31.12.2026 an das LFI zu übergeben. Für die Einzelmaßnahme Turnhalle Haftring 2. Bauabschnitt bedeutet das demnach eine zwingende Fertigstellung bis zum 30.06.2026 einschließlich Abrechnung beim Landesförderinstitut durch die BIG Städtebau GmbH.

Anderweitige Finanzierungen aus Städtebaufördermitteln werden durch das Ministerium nicht in Aussicht gestellt. Es besteht keine Möglichkeit, in ein neueres Programm der Städtebauförderung „überführt“ zu werden, um den 2. Bauabschnitt Turnhalle Haftring erst nach dem 30.06.2026 zu Ende zu führen.

Der 1. Bauabschnitt befindet sich bekanntlich in Ausführung, mit dem 2. Bauabschnitt sollte schnellstmöglich begonnen werden. Wegen der oben dargestellten Umsetzungs- und Abrechnungsmodalitäten erfolgte am 20.05.2025 ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Baukonzept Neubrandenburg GmbH zur möglichen terminlichen Umsetzung des Vorhabens. Mit Stand 21.05.2025 wurde vom Planungsbüro folgender möglicher Projektablaufplan für den 2. Bauabschnitt mitgeteilt:

1. Erarbeitung der Ausführungsplanung und der Ausschreibungsunterlagen bis 20.06.2025
2. Folgende Gewerke sind auszuschreiben und zu veröffentlichen:

- 2.1. Bauhauptgewerk
- 2.2. Zimmerer/Dachdecker
- 2.3. Fenster/Türen/Tore
- 2.4. Trockenbau
- 2.5. Fliesenleger
- 2.6. Maler
- 2.7. Bodenbelag
- 2.8. Sportboden
- 2.9. Außenanlagen
- 2.10. HLS (Büro Lünse)
- 2.11. Elektro (Büro Lünse)

2. Submission: letzter Termin 14.07.2025
3. Auswertung und Bietergespräche bis 25.07.2025
4. Baubeginn: 04.08.2025
5. Bauende: 29.05.2026

Die aktuellen Projekt- bzw. Bauablaufpläne für beide Bauabschnitte sind als Anlage 2 und 3 beigelegt. Es wird eingeschätzt, dass die rechtzeitige Baufertigstellung nach heutiger Kenntnis möglich ist. Selbstverständlich sind mögliche Unwägbarkeiten und Verzögerungen im Bauablauf nicht vorherzusagen, demnach gibt es keine Garantie, dass das Vorhaben auch planmäßig am 29.05.2026 beendet ist. Die BIG Städtebau GmbH kann zusichern, die Abrechnung parallel zum Baufortschritt zu erstellen, um einen Verwendungsnachweis bis zum 30.06.2026 beim Landesförderinstitut einzureichen, wenn der Baufertigstellungstermin gehalten wird.

Erfolgt die Baufertigstellung des 2. Bauabschnittes nicht rechtzeitig, hat dies zur Folge, dass die bewilligten Städtebaufördermittel nicht in Anspruch genommen werden dürfen, da der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck nicht bzw. nicht rechtzeitig erfüllt ist. Dies würde dann bedeuten, dass die Stadt die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt in voller Höhe als Eigenanteil zu tragen hat. Ein solcher Fall ist für die Stadt Seebad Ueckermünde bisher nie

eingetreten. Die Verwaltung wird schnellstmöglich auch das Gespräch mit den Verantwortlichen im Ministerium suchen, um Lösungen zu besprechen, für den Fall, dass noch Restleistungen, z.B. Gestaltung der Außenanlagen, nach dem 30.06.2026 offen sind.

Unabhängig davon ist aber aus Sicht der Verwaltung eine Entscheidung zum Fortgang des Projektes zu treffen.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, baulich erforderliche Maßnahmen zu treffen, die die Nutzung der Turnhalle sicherstellen für den Fall, dass der 2. Bauabschnitt jetzt nicht mit Städtebaufördermitteln realisiert wird und ggf. später erfolgen kann, wenn anderweitige Fördermöglichkeiten bestehen. Die Chance darauf wird allerdings von der Verwaltung eher als gering eingeschätzt, da es sich bei der Turnhalle Haffring um eine „Vereinsturnhalle“ handelt. Eine konkrete Abstimmung dazu, wie nach Fertigstellung der energetischen Sanierung im Bestand die Nutzung sichergestellt werden könnte, hat mit dem Planungsbüro dann noch zu erfolgen. So müssten ggf. Bestandteile aus dem 2. Bauabschnitt noch mit umgesetzt werden (ggf. barrierefreier Zugang, Stellflächen, Außenanlagen). Als Problem wird derzeit eingeschätzt, dass die Lager- und Unterstellmöglichkeiten für Sportgeräte u.a. erst vollumfänglich im Erweiterungsbau vorgesehen waren und bisher vorhandene Lagerfläche im Bestand zu Gunsten der Sanitarräume weichen mussten.

Wie von Beginn des Projektes „Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Haffring 21“ an immer wieder betont, sind die beiden Abschnitte zwar baulich abgrenzbar und durchführbar. Nach wie vor sind sie aus Sicht der Verwaltung und des Planers jedoch nur als ein Gesamtkonzept zu realisieren, um eine zukunftsfähige Nutzung durch die Vereine der Stadt zu ermöglichen.

Wie vom Planungsbüro dargestellt, sind Vergabeverfahren für die benannten Gewerke für den 2. Bauabschnitt in Form von Öffentlichen Ausschreibungen im zeitlichen Ablauf bereits vor einer Entscheidung der Stadtvertretung zum Fortgang des Vorhabens einzuleiten. Sollte es wegen der Entscheidung der Stadtvertretung zu einer Aufhebung von Ausschreibungen und nicht zu einer Auftragserteilung kommen, können Bieter ggf. eine Entschädigung verlangen. Diese bezieht sich dann auf den Ersatz der mit der Teilnahme verbundenen Aufwendungen (sogenannter „kleiner Schadensersatz“). Dies sind in der Regel die Kosten der Angebotserstellung.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt auf Grundlage des vorgelegten Projektablaufplanes (Anlage 3), mit den bereits bewilligten Städtebaufördermitteln den 2. Bauabschnitt des Vorhabens „Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Haffring 21“ (Erweiterung und Anbau) baulich umzusetzen. Diese Entscheidung ergeht in Kenntnis darüber, dass bei nicht rechtzeitiger Fertigstellung und Abrechnung der Städtebaufördermittel zum Stichtag 30.06.2026 Fördermittel ganz oder teilweise nicht in Anspruch genommen werden können und die Kosten in diesem Fall durch die Stadt selbst zu tragen sind.

oder:

Die Stadtvertretung beschließt, mit den bereits bewilligten Städtebaufördermitteln den 2. Bauabschnitt des Vorhabens „Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Haffring 21“ (Erweiterung und Anbau) baulich nicht umzusetzen. Der Bürgermeister wird beauftragt, ggf. baulich erforderliche Maßnahmen zu treffen, um die Nutzung der Turnhalle auch ohne Erweiterung sicherzustellen. Der Bürgermeister wird beauftragt, andere Fördermittel für den 2. Bauabschnitt einzuwerben, um langfristig dem Nutzungskonzept des Gesamtvorhabens Rechnung zu tragen.

Finanzielle Auswirkungen

gemäß Finanzierungsplan (Anlage 1) bzw. den o.a. Ausführungen

Anlage/n

1 - Finanzierungsplan Turnhalle Haftring 21 (öffentlich)

2 - Bauzeitenplan Sanierung/Erweiterung Turnhalle am Haftring, 1. Bauabschnitt (Stand 26.05.2025) (öffentlich)

3 - Bauzeitenplan Sanierung/Erweiterung Turnhalle am Haftring, 2. Bauabschnitt (Stand 28.05.2025) (öffentlich)

**DS-25/0070 Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Haffring 21
Anlage 1**

Stadt Seebad Ueckermünde
Am Rathaus 3
17373 Ueckermünde

**Zuwendung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten Programmjahr 2022 (1. BA)
und Städtebaufördermittel (2. BA)**

Finanzierungsplan Turnhalle Haffring 21

Projekt Sanierung

Kosten:	2.017.232,95 €	Kostenberechnung Stand 04.12.2023
<i>Zuwendung Investitionspaket Bund:</i>	984.972,22 €	48,83%
<i>Zuwendung Investitionspaket Land:</i>	341.327,78 €	16,92%
erforderlicher Eigenanteil Stadt:	147.367,67 €	7,31%
Zuwendung Investitionspakt gesamt:	1.473.667,67 €	
zusätzlicher Eigenanteil Stadt:	543.565,28 €	26,95%
		<hr/> 100,00%

1. BA Eigenanteil gesamt 690.932,95 € 34,25%


Projekt Erweiterung/Anbau:

Kosten:	1.861.069,16 €	Kostenberechnung Stand 04.12.2023
<i>Städtebauförderung (Bund/Land):</i>	1.100.000,00 €	59,11%
Städtebauförderung (Eigenanteil Stadt):	550.000,00 €	29,55%
zusätzlicher Eigenanteil Stadt:	211.069,16 €	11,34%
		<hr/> 100,00%

2. BA Eigenanteil gesamt 761.069,16 € 40,89%

Zuwendung gesamt (1./2. BA)	2.426.300,00 €	62,56%
Eigenanteil Stadt gesamt (real):	1.452.002,11 €	37,44%
gesamt	3.878.302,11 €	100,00%

Bauzeitplan
13624_Sanierung/Erweiterung Turnhalle am Haffring BA1

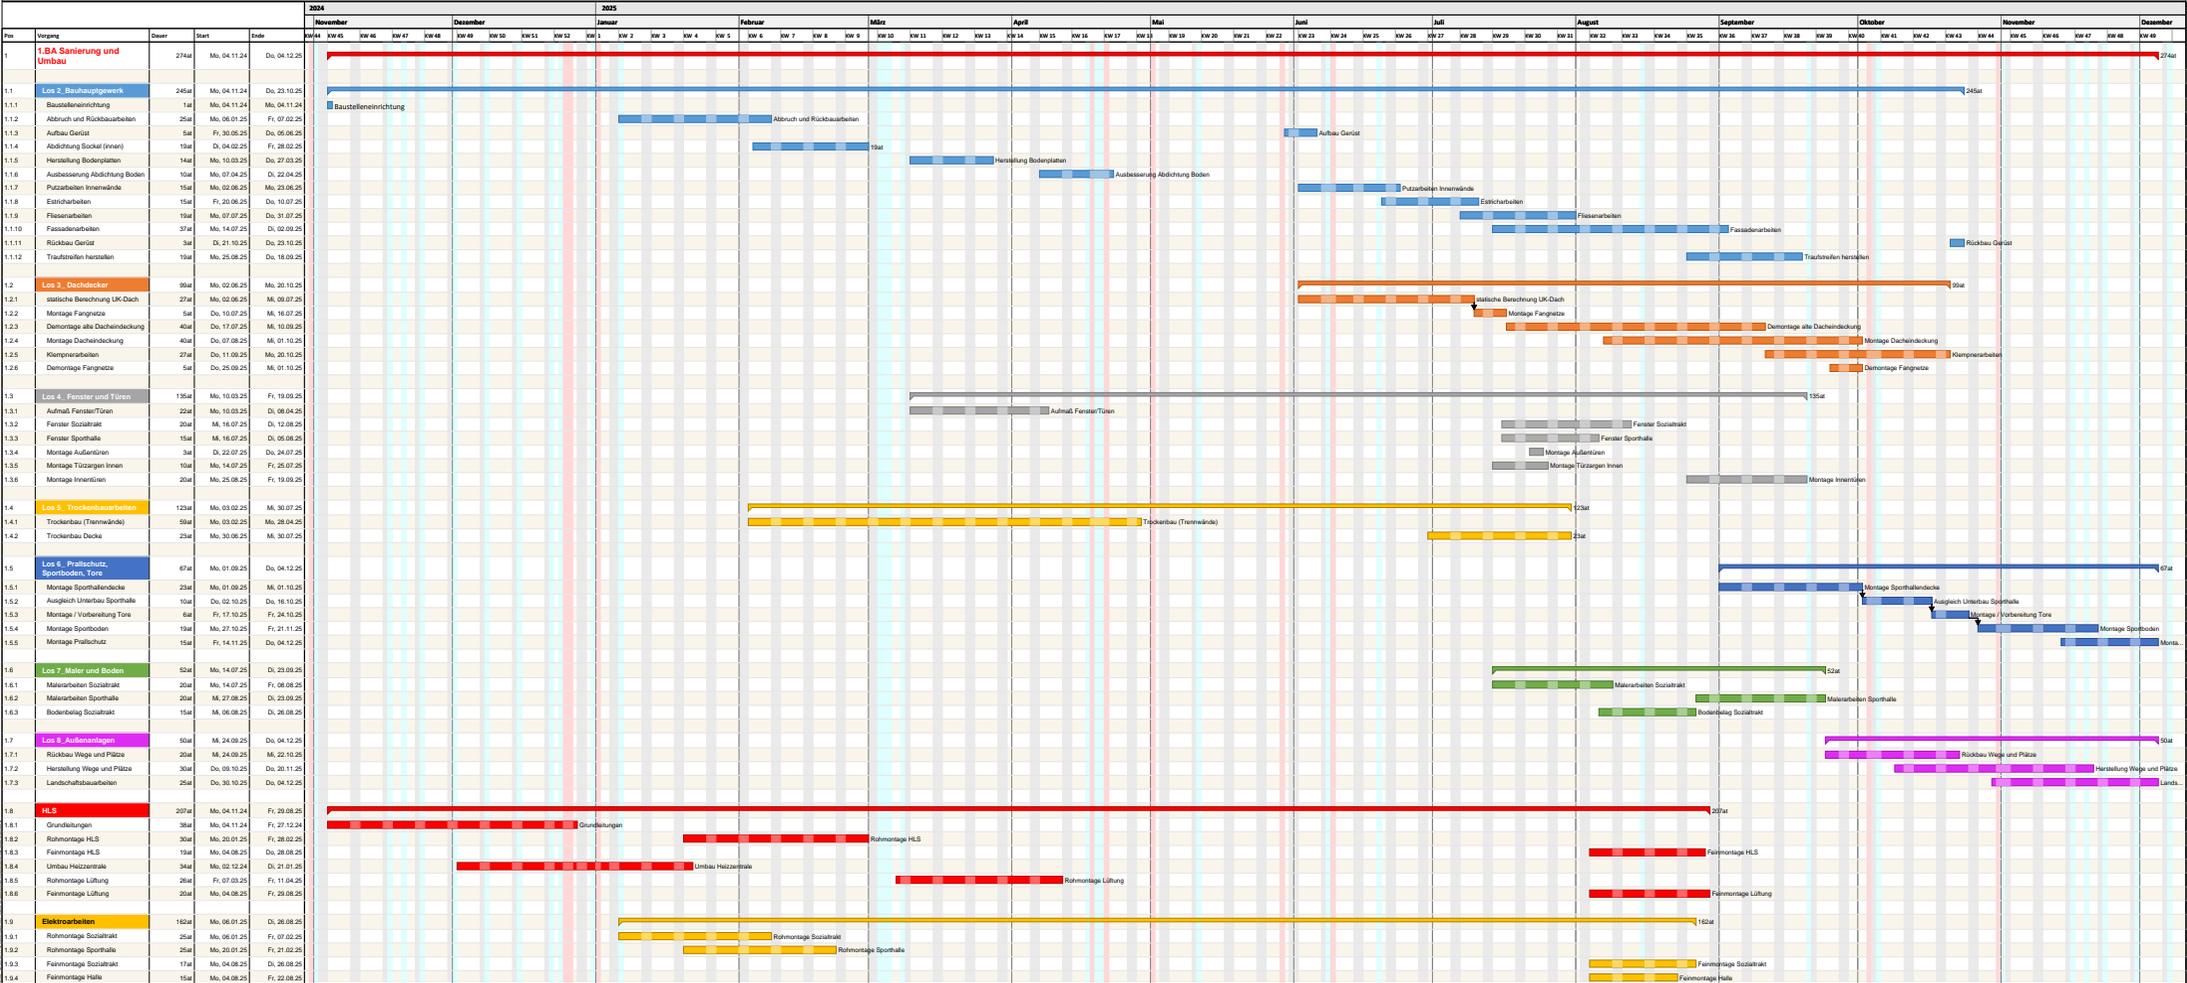

Projektdaten vom Mo, 21.10.24 bis Mo, 12.01.26
 Kalender: Standard (Vormittag (empfohlen))
 Startdatum: 26.05.2025 15:56
 Titel: Baustanplan

Projektnummer: 13624

Turnhalle Am Haffring - 2. BA (Stand 28.05.2025)

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	August 2025				September 2025				Oktober 2025				November 2025				Dezember 2025				Januar 2026				Februar 2026				März 2026				April 2026				Mai 2026							
					KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22
1	BAUPHASE	205at	Mo, 04.08.25	Fr, 29.05.26	BAUPHASE																																											
1.1	Abstimmung Rohbaumaße Fenster / Türen	5at	Mo, 04.08.25	Fr, 08.08.25	5at Abstimmung Rohbaumaße Fenster / Türen																																											
1.2	Erdarbeiten	20at	Mo, 04.08.25	Fr, 29.08.25	20at Erdarbeiten																																											
1.3	Gründg./Grundf. SW	20at	Mo, 25.08.25	Fr, 19.09.25	Gründg./Grundf. SW																																											
1.4	Rohbau (Mauerarbeiten, 3 Lagen), Abdichtung Sockel innen	10at	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25	10at Rohbau (Mauerarbeiten, 3 Lagen), Abdichtung Sockel...																																											
1.5	Betonboden	14at	Mo, 22.09.25	Fr, 10.10.25	14at Betonboden																																											
1.6	Rohbau (Mauer-/Betonarbeiten, Ringanker)	15at	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25	15at Rohbau (Mauer-/Betonarbeiten, Ringanker)																																											
1.7	Zimmerer- und Dacharbeiten	14at	Mo, 27.10.25	Fr, 14.11.25	14at Zimmerer- und Dacharbeiten																																											
1.8	Giebel- / Traufbekleidung	10at	Mo, 17.11.25	Fr, 28.11.25	10at Giebel- / Traufbekleidung																																											
1.9	Schweißbahn	5at	Mo, 24.11.25	Fr, 28.11.25	5at Schweißbahn																																											
1.10	Wärmedämmung inkl. Dampfbremse Dach	13at	Mo, 01.12.25	Fr, 17.12.25	13at Wärmedämmung inkl. Dampfbremse Dach																																											
1.11	Einbau Fenster / Außentüren	10at	Do, 11.12.25	Fr, 24.12.25	10at Einbau Fenster / Außentüren																																											
1.12	Elektro-Rohinstall.	15at	Mo, 05.01.26	Fr, 23.01.26	15at Elektro-Rohinstall.																																											
1.13	HLS-Rohinstall.	15at	Mo, 05.01.26	Fr, 23.01.26	15at HLS-Rohinstall.																																											
1.14	Innenputz	15at	Mo, 19.01.26	Fr, 06.02.26	15at Innenputz																																											
1.15	Trockenbau (Trenn- / Vorwände)	5at	Mo, 02.02.26	Fr, 06.02.26	5at Trockenbau (Trenn- / Vorwände)																																											
1.16	Innentüren - Türzargen (Einbau)	5at	Mo, 09.02.26	Fr, 13.02.26	5at Innentüren - Türzargen (Einbau)																																											
1.17	Estrich	20at	Mo, 16.02.26	Fr, 13.03.26	20at Estrich																																											
1.18	Trockenbau (Decke, Wände)	15at	Mo, 09.03.26	Fr, 27.03.26	15at Trockenbau (Decke, Wände)																																											
1.19	Fliesenarbeiten	8at	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26	8at Fliesenarbeiten																																											
1.20	Gerüstbau Fassade	129at	Mo, 06.10.25	Fr, 10.04.26	129at Gerüstbau Fassade																																											
1.21	Außenputz	18at	Mo, 16.03.26	Fr, 10.04.26	18at Außenputz																																											
1.22	Sockelputz	14at	Mo, 13.04.26	Do, 30.04.26	14at Sockelputz																																											
1.23	Maler (Decke+Wände+Fußböden)	18at	Mo, 30.03.26	Fr, 24.04.26	18at Maler (Decke+Wände+Fußböden)																																											
1.24	Elektro-Feininstall.	13at	Mo, 27.04.26	Fr, 15.05.26	13at Elektro-Feininstall.																																											
1.25	HLS-Feininstall.	9at	Mo, 04.05.26	Fr, 15.05.26	9at HLS-Feininstall.																																											
1.26	Türblätter (Einbau inkl. Einstellg.)	9at	Mo, 18.05.26	Fr, 29.05.26	9at Türblätter (Einbau inkl. Einstellg.)																																											
1.27	Maler (Feinarbeiten)	4at	Di, 26.05.26	Fr, 29.05.26	4at Maler (Feinarbeiten)																																											
1.28	Außenanlagen	80at	Mo, 02.02.26	Fr, 29.05.26	80at Außenanlagen																																											

Projektzeiträume von Mo, 07.07.25 bis Fr, 03.07.26
 Kalender: Mecklenburg-Vorpommern (eingebettet)
 Druckdatum: 28.05.2025 11:07
 Filter:

Bearbeiter: Sven Schünemann, Dipl.-Ing. (TU/Architektur)

Gerstenstraße 9
 Neubrandenburg
 Tel. +49 395 4255910
 Fax +49 395 4255920
 e-Mail: info@baukonzept-nb.de
